國家運動科學中心大樓新建工程

細部設計階段第一次工作會議紀錄

一、 時間：115 年 9 月 17 日（星期四）上午 9 時 30 分

二、 地點：本署北區都市基礎工程分署 B1 會議室

三、 主持人：賴隊長仁達　　紀錄：吳志隆

四、 出席單位及人員：詳簽到表

五、 主席致詞：(略)

六、 業務單位報告：

本工程規劃設計方案於 115 年 8 月 4 日審定，並自 115 年 8 月 5 日起計細部設計作業期程。配合規劃設計方案定案後之基地範圍，辦理基地地號分割作業，相關作業涉及後續建築管理許可申請之前置程序；另因應綠建築評估手冊改版之過渡期間版本選用，為有效控管整體設計期程，並確認細部設計內容及技術可行性，爰召開本次會議。

七、 啟達聯合建築師事務所（呂國勝建築師）簡報說明：(略)

八、 會議決議：

案由一：有關本案基地左北段中1690、1689及1688-19(營區道路)等地號，配合規劃方案定案辦理土地分割作業之策略、程序及期程，提請討論。

說　明：本案原基地範圍約1.80公頃，配合規劃方案調整為約1.98公頃，涉及左北段中1690、1689及1688-19(營區道路)等地號分割作業。土地分割為後續建築管理許可申請之重要前置作業，請技術服務廠商說明本基地分割辦理策略、程序及預定期程，並釐清洽辦機關應配合辦理事項及時程，以確保後續建築管理許可申辦作業順利銜接。

決　議：

(一) 請啟達聯合建築師事務所（呂國勝建築師）（下稱技服廠商）協助釐清確認土地分割、鑑界等事宜所需之程序及書圖文件，以利洽辦機關辦理相關作業。另本案完成後之使用單位為國家運動科學中心（下稱運科中心），為符管用合一，洽辦機關表示於完成土地取得後，將依程序無償提供該中心使用，並擔任本案起造人。

(二) 技服廠商擬於116年1月申請建築線，建請洽辦機關於115年12月31日前完成基地分割作業，為使期程順遂，爰請技服廠商依實際基地範圍於115年9月24日前函送地籍分割參考資料予本署確認，俾利轉請洽辦機關辦理後續土地分割事宜。

(三) 考量本案申辦建築許可取得期程，請洽辦機關於本案建造執照取得前（預計116年5月）完成環境影響差異分析（下稱環差），並請技服廠商適時協助洽辦機關辦理環差作業。

(四) 相關辦理事項納入後續工作會議列管事項，俾利追蹤辦理進度。

案由二：有關本案綠建築評估手冊版本選用，提請討論。

說　明：依內政部建築研究所115年6月11日公布2026年版綠建築評估手冊，除調整為六大指標，因配合低碳（低蘊含碳）建築標示制度分段推行，故119年7月1日前得由申請人自行擇定2023或2026版本，請技服廠商分析擬採用版本差異及評分對應策略。

決　議：原則同意技服廠商就2023年版綠建築評估架構經長期實務驗證，其設計手法及業管審查機制較為穩定等分析，避免不熟悉2026版新規致取得證書期程延宕，經與會單位討論後本案綠建築評估手冊採用2023版本。

案由三：為達成2050淨零排放目標，提升建築物能源使用效率、科技應用、防災及安全性能，本工程「節能減碳、環境保育」等設計策略，提請討論。

說　明：請技服廠商依設計內容說明本工程相關「節能減碳、防災及安全創新科技、室內、外建材選用（包含建器材設備擇用與預鑄構件）及品質耐久性與維護管理」等相關設計策略。

決　議：本次簡報內容主要為列舉後續擬採用建材類別與設備類別，請技服廠商在符合預算額度、無限制競爭及施工可行性下，並考量本案整體立面、節能減碳、取分策略及使用需求等情況，補充說明各主要建材及設備選用說明，併同10月2日主要建器材提送。其餘非工程基本需求或許可審查必要項目，得由洽辦機關納入後續營運管理需求另行建置。

案由四：本案基地北側出入口既有人行道、公車站等公共設施調整及遷移協調事宜，提請討論。

說　明：本案基地出入動線須穿越既有人行道及公車站等公共設施始得銜接既有道路，涉及相關公共設施之調整及遷移，並涉及權責主管機關之協調。為確保基地出入動線之順暢及安全，請技術服務廠商提出具體建議方案及所涉協調事項，供洽辦機關據以洽請權責主管機關協助辦理。

決　議：本案主要出入口毗鄰公車亭，為避免出入車輛與公車交會肇生危險，爰請技服廠商於115年9月24日前提出公車亭、行道樹及路燈移置建議方案，以利後續洽辦機關洽請高雄市政府主管單位辦理會勘，並納入後續工作會議列管事項，俾利追蹤辦理進度。

案由五：有關本案運科檢測數據串接國家運動訓練中心既有弱電（資訊）機房之整體路線及共同管溝介面規劃，提請討論。

說　明：本工程原則以本案基地範圍內共同管溝施作為限。惟依工作作業說明及洽辦機關需求，本案運科檢測數據須串接至國家運動訓練中心既有弱電（資訊）機房，請技術服務廠商提出整體串接路線、共同管溝配置及各基地介面銜接方案，並釐清本工程施作範圍及跨基地所涉協調事項。

決　議：因整體地理條件，本案串接國家運動訓練中心既有弱電（資訊）機房之共同管溝路線需穿越施工中國家運動園區（第三期）基地範圍，為確認整體路線方案可行性，請技服廠商依國家運動園區（第三期）管溝施工圖說及既有國訓中心管線配置檢討串聯可行性，於9月底前提出完整建議方案（含人孔及管溝初步規格）。

案由六：有關本案設備減震需求之空間規劃，提請討論。

說　明：本案二層運動面層實驗分析室、三層影像診斷與評估研究室、超音波室及心理狀態分析室、四層功能代謝分析精密儀器室，以及五層UPS及鋼瓶室、攝影棚等空間，採格子樑設計以控制樓版垂直振動，請技服廠商與洽辦機關確認本案是否尚有其他因設置精密儀器或特殊設備而有減震需求之空間。

決　議：

(一) 有關本案設備減震需求空間，技服廠商提供建議考量設備減震之空間（詳附件），經洽辦機關確認符合需求。

(二) 本案後續營運將由使用單位自行購置運科儀器設備，為確認相關工程介面（如降板、減震等級、設備基座、管線預留及測力板等）是否需預為納入本案主體工程設計考量，請洽辦機關於10月底提出需求，俾利技服廠商套繪檢討細部設計發展及整體預算評估。

九、 臨時動議：

十、 散會：下午 12 時 15 分

紅框所示為減震需求範圍

1 2 3 4 5 6 7

1030 1120 1120 920 1120 1500

N

上方雨遮投影

上方帷幕投影

109 國際會議室 (400m2)

106 大廳 (200m2)

展示區

風除室 ±0

等候區

保全, 服務櫃台

103 開標室 (40m2)

102 會議室 (36m2)

101 多功能綜合力量檢測 肌力體能檢測室／力學檢測室 (320m2)

105 機房 (15m2)

104 監控室 (40m2)

111 儲藏室 (45m2)

110 講師休息室 (20m2)

108 醫護室 (20m2)

107 行政空間 (50m2)

554

517

300

150

82

180

925

930

D C B A

120 茶水間

118 工具間

121 無障礙廁所

119 哺乳室

122 男廁

123 女廁

125 A/C機房 (40m2)

124 環境室 (265m2)

117 虛實整合實驗室 (300m2)

112 運動生理生測驗品 (135m2)

116 運動生理檢測室 (20m2)

115 運動分子生物實驗室 (20m2)

114 細胞培養與分析室 (20m2)

113 運動生理研究室 (20m2)

500

-10

技師簽證

內政部許可文號：

建築師簽證

內政部國土管理署
National Land Management Agency, Ministry of the Interior

國家運動科學中心大樓新建工程

圖名
一樓平面圖(上半部) S=1:200

000		工程編號		啟達聯合建築師事務所(呂國勝建築師)			圖號
000		核准日期		繪圖		複核	04 A2
000				設計		核准	
				初核		日期	

紅框所示為減震需求範圍

上方雨遮投影

上方帷幕投影

1030 1120 1120 920 1120 1500

925 930 925

207 設備空間(會議室) (72m2)

205 肌力體能研究室 (80m2)

209 運動面層實驗分析室 (80m2)

208 綜合討論室 (75m2)

206 機房 (15m2)

201 運動設備(跑步機) (60m2)

216 A/C機房 (40m2)

215 恢復室 (325m2)

210 茶水間

212 工具間

211 無障礙廁所

213 女廁

214 男廁

217 觀測平台 (100m2)

204 身體組成檢測室 (30m2)

203 運動生化檢測室 (20m2)

202 運動生化檢測室 (20m2)

電力及弱電管道 空調管道 消防管道 給排水管道

技師簽證

內政部許可文號：

建築師簽證

內政部國土管理署
National Land Management Agency, Ministry of the Interior

國家運動科學中心大樓新建工程

圖名
二樓平面圖(上半部) S=1:200

OOO		工程編號		啟達聯合建築師事務所(呂國勝建築師)			圖號
OOO		核准日期		繪圖		複核	07 A2
OOO				設計		核准	
				初核		日期	

紅框所示為減震需求範圍

1 2 3 4 5 6 7

1030 1120 1120 920 1120 1500

N

D C B A

925 930 925

挑高鷹眼模擬區

305 多功能鷹眼技術開發實驗室 (315m2)

303 多功能會議討論室 (26m2)

302 多功能會議討論室 (26m2)

301 處長室 (25m2)

315 心理狀態分析室 (舒壓室) (55m2)

314 超音波室 (含查診空間) (55m2)

313 影像診斷與評估研究室 (120m2)

絕排水管道

電力及弱電管道

307 機房 (15m2)

306 儲藏室 (25m2)

空調管道

消防管道

304 研究人員, 技術人員辦公室(72人) (365m2)

陽台 (23m2)

322 A/C (26m2)

321 多功能運動心理研究室 (70m2)

320 腦功能研究分析 (含電生理實驗室及自律神經檢測室) (130m2)

319 心智功能評估室 (68m2)

316 茶水間

317 無障礙廁所

318 性別友善廁所

312 自我效能與行為科學實驗室 (63m2)

311 運動心理教具儲藏室 (45m2)

308 運動心理學研究室 (73m2)

310 個人分析室A (20m2)

309 個人分析室B (20m2)

露台

技師簽證

內政部許可文號:

建築師簽證

內政部國土管理署 National Land Management Agency, Ministry of the Interior	國家運動科學中心大樓新建工程	圖名 三樓平面圖(上半部) S=1:200	OOO		工程編號		啟達聯合建築師事務所(呂國勝建築師)				圖號
			OOO		核准日期		繪圖		複核		10 A2
			OOO				設計		核准		
							初核		日期		

紅框所示為減震需求範圍

1 2 3 4 5 6 7

1030 1120 1120 920 1120 1500

N

D C B A

925 930 925

401 運動醫學整合實驗室(內含足部整合表現中心) (400m2)

402 開放式休息區 (35m2)

403 機房 (15m2)

404 處長室 (19m2)

405 會議室 (20m2)

406 運醫研究人員28人 (160m2)

407 睡眠評估實驗室 (140m2)

408 運醫, 醫師會談空間 (50m2)

409 藥品儲藏室 (15m2)

410 運動生理儲藏室 (12m2)

411 功能代謝分析精密儀器室 (80m2)

412 茶水間

413 無障礙廁所

414 女廁

415 男廁

416 營養代謝分析區 (85m2)

417 庫房, 檔案室 (20m2)

418 冷藏, 冷凍空間 (25m2)

419 功能營養研究室 (100m2)

420 A/C (26m2)

運動功能測試與評估實驗區

陽台 (23m2)

露台

554 517 400 420 180 240

1500 1490


給排水管道 電力及弱電管道 空調管道 消防管道

技師簽證

內政部許可文號:

建築師簽證

內政部國土管理署 National Land Management Agency, Ministry of the Interior	國家運動科學中心大樓新建工程	圖名 四樓平面圖 S=1:200	OOO		工程編號		啟達聯合建築師事務所(呂國勝建築師)				圖號
			OOO		核准日期		繪圖		複核		11 A2
			OOO				設計		核准		
							初核		日期		

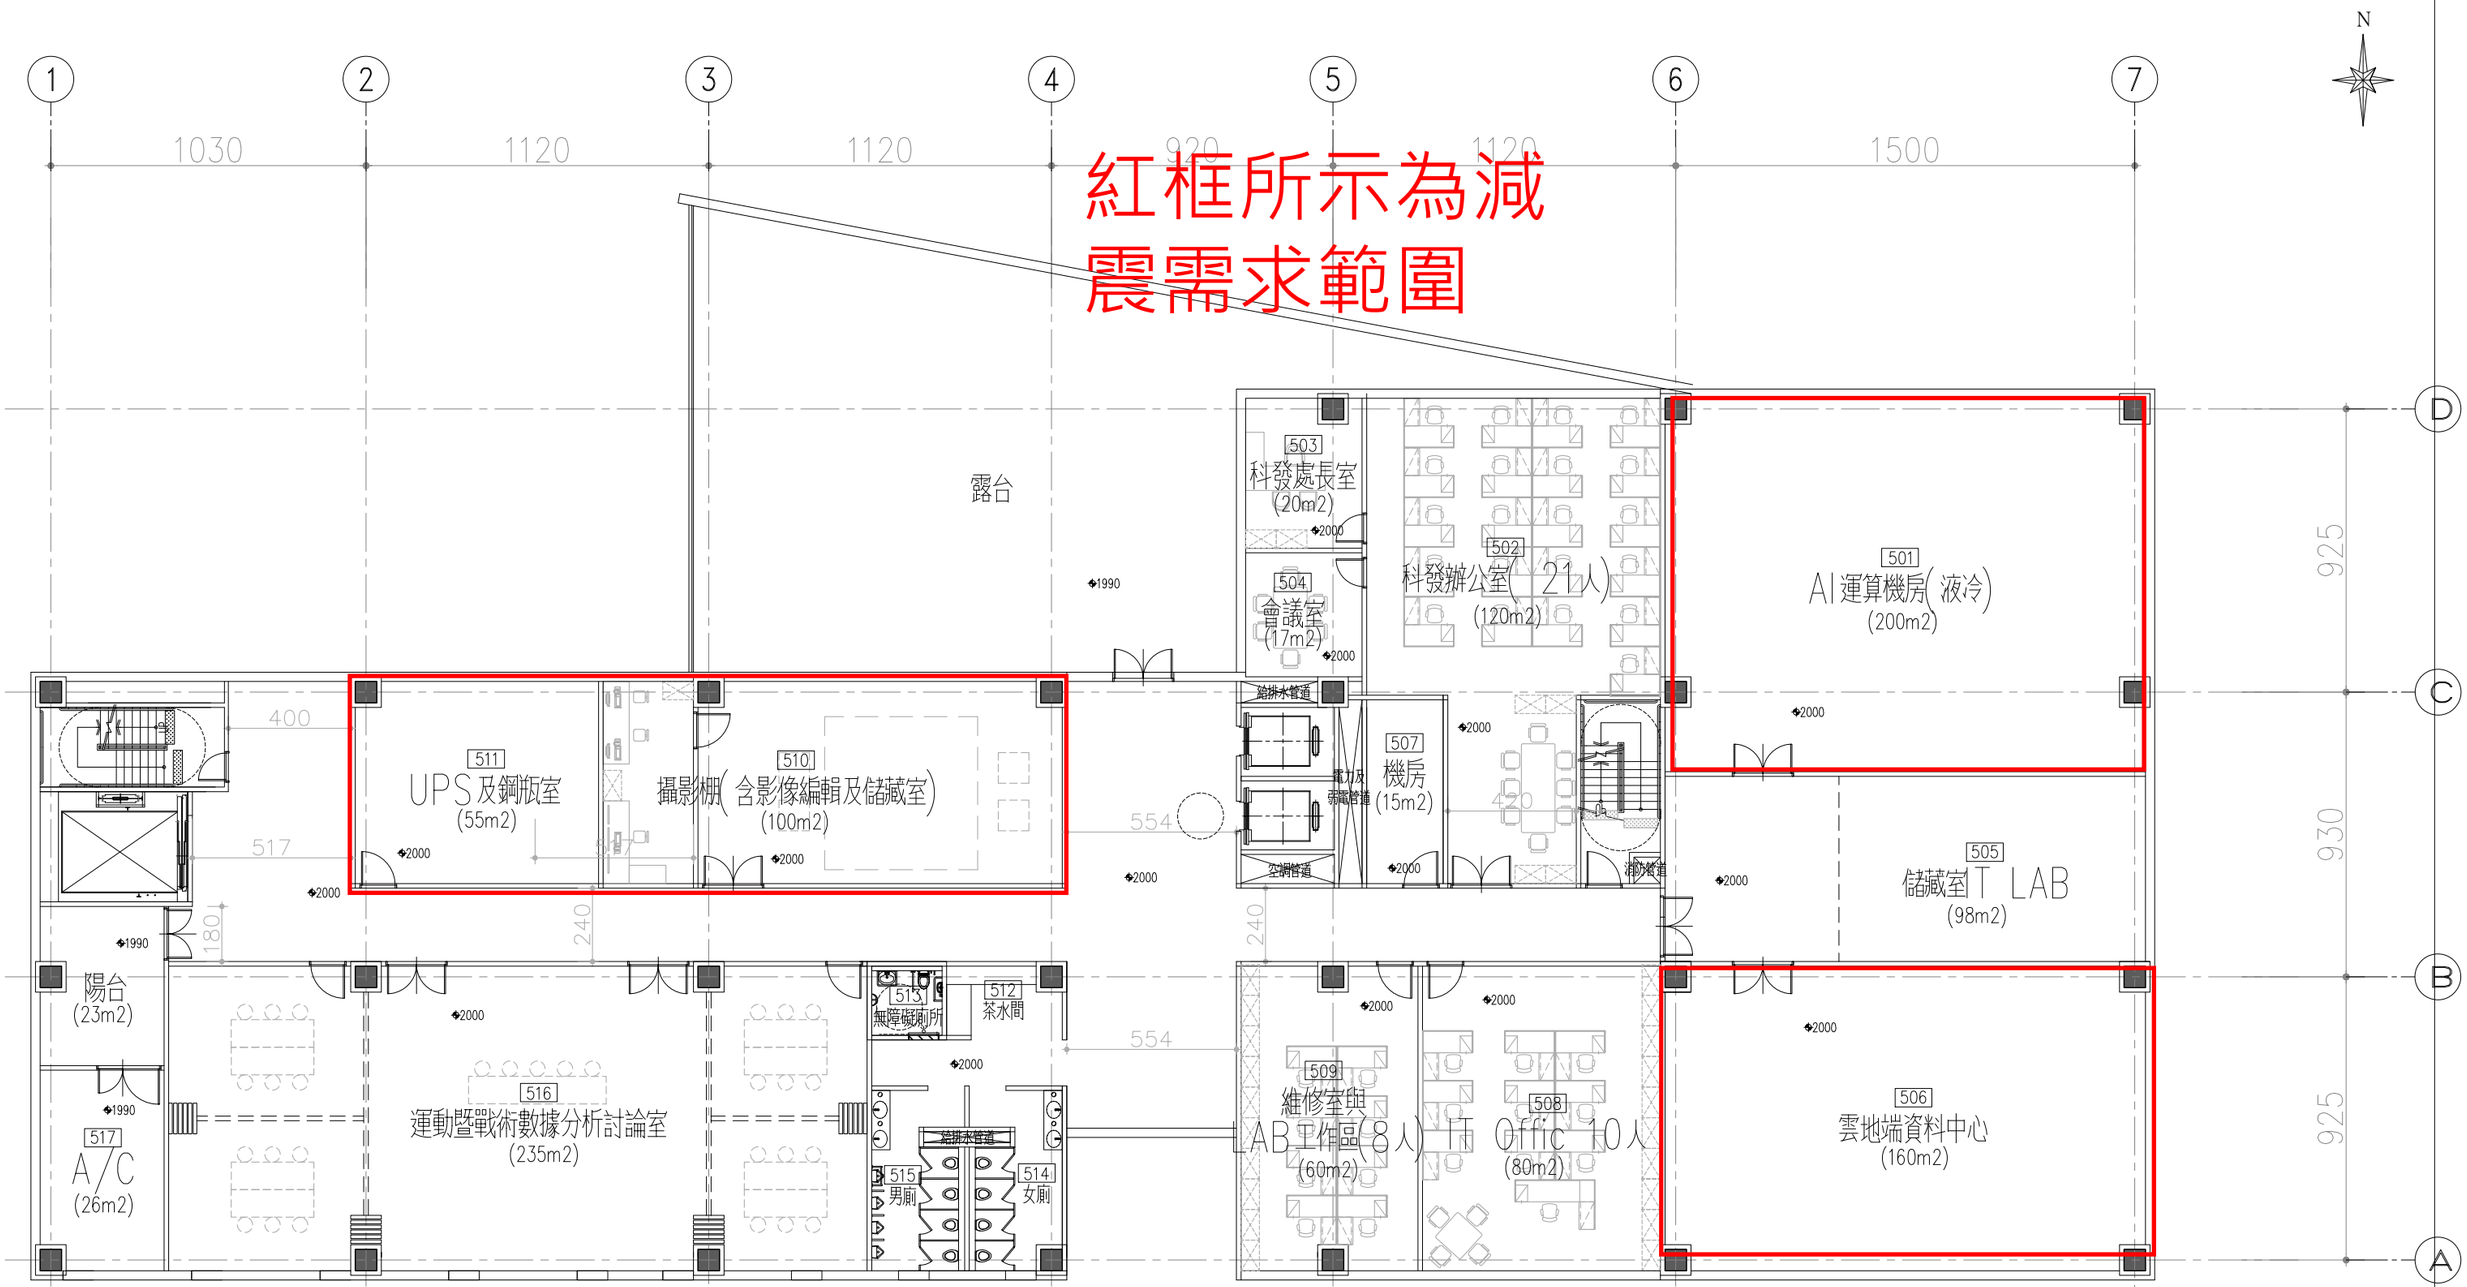


內政部國土管理署 National Land Management Agency, Ministry of the Interior	國家運動科學中心大樓新建工程	圖名 五樓平面圖 S=1:200	000		工程編號		啟達聯合建築師事務所(呂國勝建築師)		圖號
			000		核准日期		繪圖	複核	12 A2
			000				設計	核准	
							初核	日期	

技師簽證

內政部許可文號：

建築師簽證

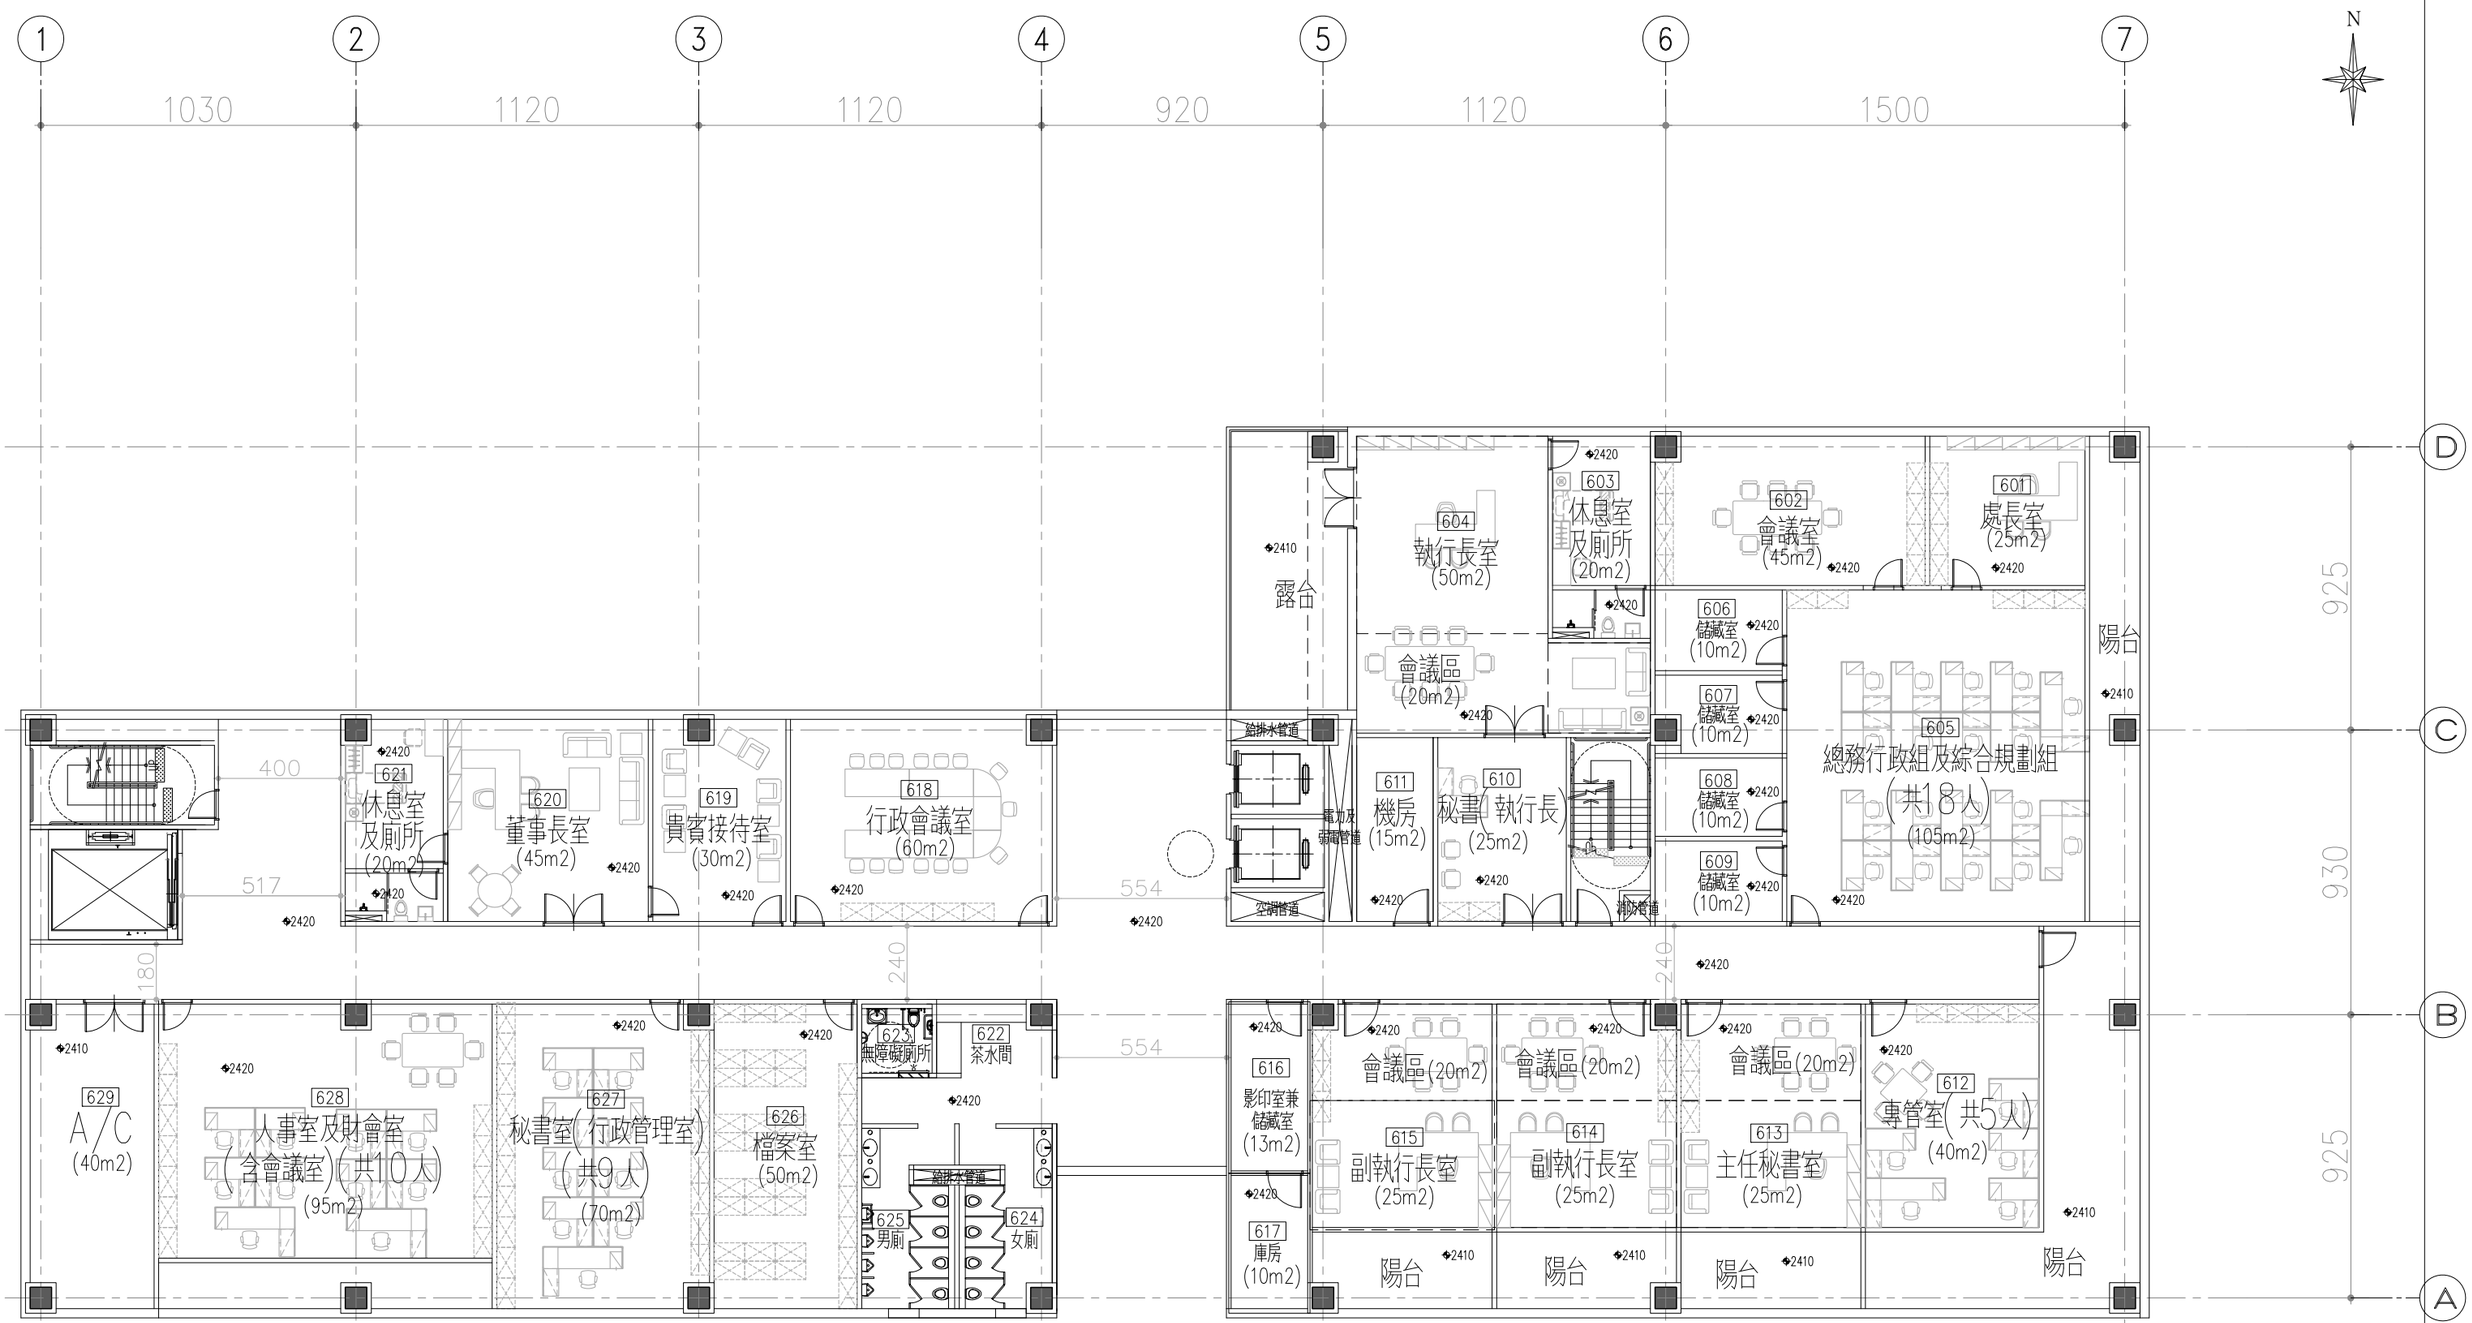

內政部國土管理署
National Land Management Agency, Ministry of the Interior

國家運動科學中心大樓新建工程

圖名
六樓平面圖 S=1:200

000		工程編號		啟達聯合建築師事務所(呂國勝建築師)			圖號
000		核准日期		繪圖		複核	13 A2
000				設計		核准	
				初核		日期	

技師簽證

內政部許可文號:

建築師簽證
